


Ведомость закладываемых проемов фрагмента 5 этажа в осях 1-18/А-Р			
Марка	Наименование	Объем, куб. м.	Примечание
Зп-1.3-5-4	Перегородка из бетонного камня	0.00	
Зп-1.3-5-5	Кирпичная кладка	1.37	
Зп-1.3-5-6	Кирпичная кладка	1.71	
Зп-1.3-5-7	Кирпичная кладка	2.56	
Зп-1.3-5-8	Кирпичная кладка	2.61	
Зп-1.3-5-9	Кирпичная кладка	3.53	
Зп-1.3-5-11	КНАУФ перегородка типа С366	0.86	


12.63

Ведомость возводимых перегородок и стен фрагмента 5 этажа в осях 1-18/А-Р			
Марка	Наименование	Площадь, кв. м	Примечание

624.17

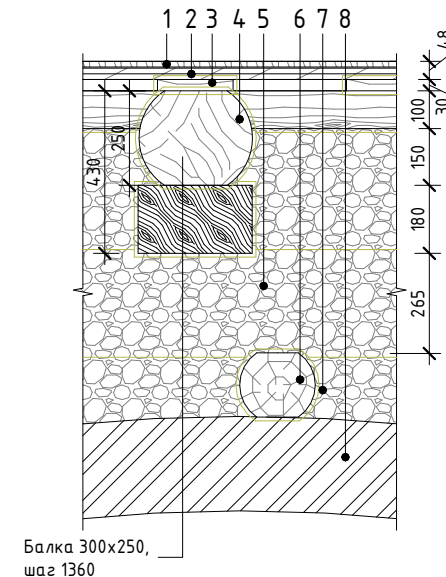

Балка 300x250,
шаг 1360



1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том
НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм

2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие
нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм

3. Добор – разреженный деревянный настил 200x30 (шаг 250
мм) – 30 мм

Существующая конструкция – см. раздел НД-2026-1-Т01.3:

4. Лага 200x100 (шаг 520)

5. Балка – древно 300x250 (шаг 1360) на подкладках из древна
250x180

6. Прогон пристенный – древно 210x265 (шаг 1360) на
подкладках из древна 200x170

7. Существующее основание – кирпичный свод

1. Восстанавливаемый паркет на клею под лаком – см. том
НД-2026-1-Р-1.3-РР.АИ – 15+3 мм

2. Подложка под паркет – фанерные листы ФК водостойкие
нешлифованные сорт 3/4, 2 слоя по 15 мм – 30 мм

3. Добор – разреженный дощатый настил 30x200 (шаг 250 мм) –
30 мм

120.28

Предусмотреть пропитку
деревянных элементов
конструкции пола
огнебиозащитным составом (см. п
VIII лист 1) (захв. 1.3: S=77,98м²).
После обработки деревянных

Предусмотреть пропитку
деревянных элементов
конструкции пола
огнебиозащитным составом (см. п
VIII лист 1) (захв. 1.3: S=53,49 м²).
После обработки деревянных
элементов пола произвести
дозасыпку пеностекляным
щебнем до верха лаг
